

10. Toelichting visuele controle installatie

10.1 Begane grond



1. Onder de verdeelinrichting in de stookruimte bevindt zich een CEE form contactdoos die niet deugdelijk gemonteerd is. (2)

2. Naast de nooduitgang bij de stookruimte bevindt zich een kabellasdoos waarvan de reserve kabelinvoer niet op de juiste wijze is afgedicht. (2)



3. In ruimte 54 bevindt zich een kabellasdoos waarvan de reserve kabelinvoer niet op de juiste wijze is afgedicht. (2)



4. In ruimte 56 bevindt zich een contactdoos waarvan de montageplaat defect is. (2)

5. De verlichting armaturen in ruimte 56 zijn niet deugdelijk aangesloten. (2)



6. In ruimte 58 bevindt zich een contactdoos die niet deugdelijk bevestigd is. (2)



7. In ruimte 58 bevindt zich tegen de buitengevel een contactdoos waarvan het beschermingscontact niet aangesloten is. (2)

8. In ruimte 57 bevindt zich een contactdoos die niet deugdelijk bevestigd is. (2)



9. Nabij ruimte 29 bevinden zich leidingen die niet op een deugdelijke wijze gemonteerd zijn. (2)



10. In ruimte 26 bevindt zich een tafelcontactdoos die aangesloten is met een YMvK kabel. (2)

11. In ruimte 26 bevindt zich een leiding die niet deugdelijk is bevestigd. (2)



12. in ruimte 26 bevindt zich een schakelaar waarvan het afdek materiaal ontbreekt. (2)




13. In ruimte 25 bevindt zich een contactdoos die niet deugdelijk bevestigd is. (2)

14. In ruimte 25 bevindt zich een kabellaskabine waarvan de reserve invoer niet op de juiste wijze is afgedicht. (2)




15. In ruimte 17 bevindt zich een kabellaskabine waar de reserve invoer niet op de juiste wijze is afgedicht. (2)

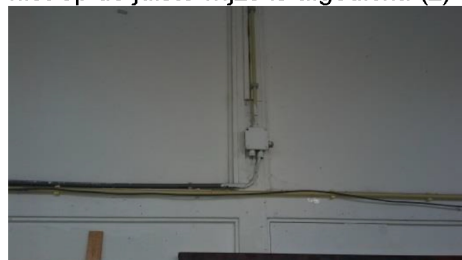



16. In ruimte 14 bevindt zich een leiding die niet deugdelijk bevestigd is. (2)

17. In ruimte 14 bevindt zich een verdeelinrichting, deze hangt op 4 meter hoogte en is dus niet bereikbaar zonder klimmateriaal. Tevens zijn de leidingen niet op een deugdelijke wijze gemonteerd. (2)

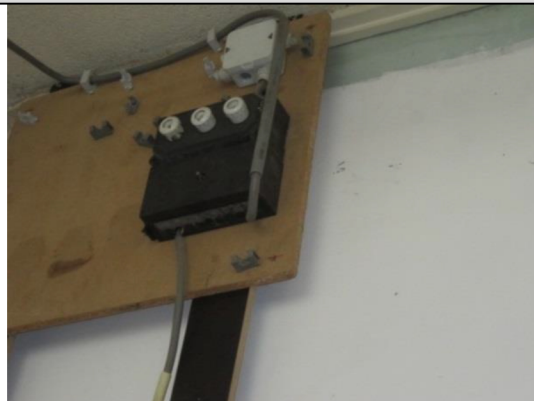

18. In ruimte 9 bevinden zich verlichting armaturen die niet op de juiste wijze zijn aangesloten. (2)



19. In ruimte 5 bevindt zich een schakelaar/ contactdooscombinatie waarvan de schakelmateriaal defect is. (2)

20. In ruimte 7 bevindt zich een kabellaskaboot waaruit een leiding steekt die niet op de juiste wijze is afgewerkt. (2)




21. In ruimte 5 bevindt zich een contactdoos die niet op de juiste wijze gesloten kan worden. (2)



22. In ruimte 3 bevindt zich een leiding die niet op de juiste wijze is afgewerkt. (2)

23. In ruimte 4 bevindt zich een leiding die niet op de juiste wijze is afgewerkt. (2)

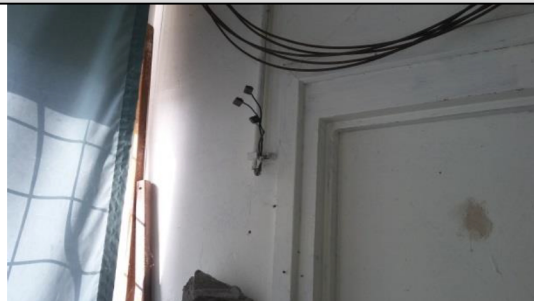


24. In ruimte 12 bevinden zich leidingen die niet op een deugdelijke wijze zijn gemonteerd. Tevens is de CEE form niet op de juiste wijze aangesloten. (2)





25. In de hal bevinden zich schakelaars van de onderste ontbreekt de afdekkap. (2)

26. In de keuken bevinden zich een schakelaar en contactdozen, deze zijn gemonteerd zonder montageplaat. (2)

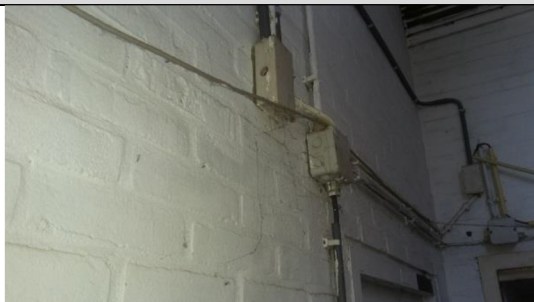

27. Door het hele pand bevinden zich in de gang BK1619 kabellasdozen waarvan de reserve kabelinvoeren niet zijn afgedicht. (2)
